




स्थानीय सरकार  
आठबिसकोट नगरपालिका



सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (SUSWA) आयोजना,  
रुकुम पश्चिम भाग कर्णाली प्रदेश

०८२ श्रावण

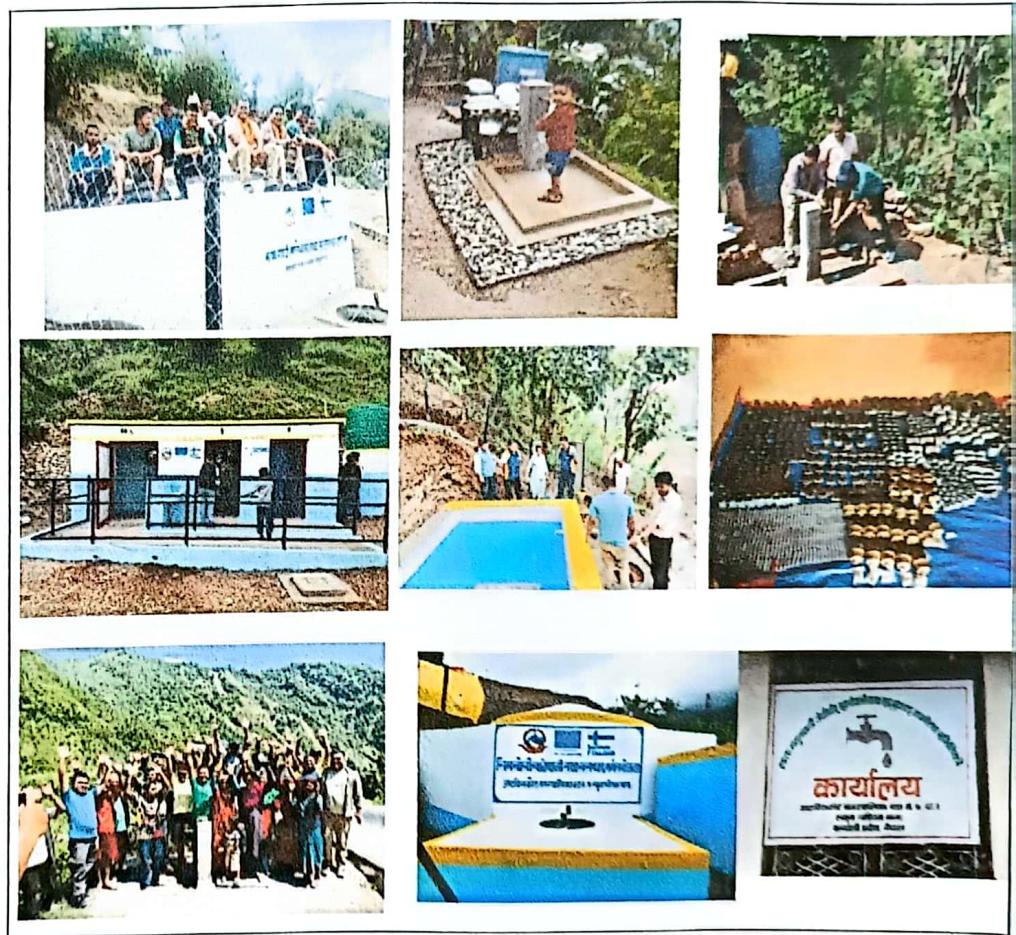

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को  
वार्षिक  
प्रगति प्रतिवेदन


*[Signature]*  
राजा रामाताम  
नि. प्रमुख प्रशासनिय अधिकृत

*[Signature]*




## बिषय सूची

आर्थिक वर्ष २०८०/८१को प्रगतिको सारांश .....	3
1. आर्थिक प्रगति सारांश .....	3
2. भौतिक प्रगति सारांश .....	4
नतिजा १: आयोजना संचालित पालिकामा दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा र लैंगिक, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि सक्षम/सबल वाताबरण र शासन सुदृढिकरण भएको हुनेछ । .....	4
नतिजा २: आयोजना संचालित पालिकाहरूमा जलवायु उत्थानशिल, सुरक्षित र नियमित खानेपानी आपूर्ति भएको हुनेछ । .....	5
नतिजा ३: दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता र पर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन .....	5
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन .....	6
१ पृष्ठभूमि .....	6
2. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी .....	7
२.१ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति: .....	7
२.१.१. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरु योजनाको कार्यान्वय सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु: .....	7
२.१.२. योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु: .....	7
२.२ भौतिक प्रगति .....	7
तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी .....	8
तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरु .....	8
तालिका २.३: लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण .....	10
तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश .....	11
अनुगमन तथा प्रतिवेदन .....	12
तालिका ३.१: नगरपालिकाबाट आयोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु .....	12
तालिका ३.२: अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन .....	13
प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा .....	13
तालिका ४.१: आठबिसकोट नगरपालिका/नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समिति तथा वास इकाइको बैठक तथा निर्णयहरु .....	14
तालिका ४.२ यस आर्थिक वर्षमा परिचालन गरिएका स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरुको सुची .....	15
नीति तर्जुमा .....	16
आठबिसकोट नगरपालिकाले नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को आय तथा व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्य प्रस्तुत भएको नगरपालिकाबाट खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रगतिको शारांश .....	16
४. सहकार्य .....	17
तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु .....	17
अनुसूची १: यसआ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण .....	18



उमीद  
कृष्ण  
श्रेष्ठ



अनुसूची २.१: यसआ.वा.मा संचालित तालिमहरूको विवरण .....	19
खानेपानी योजना घरणवद्द कार्यपद्धति व्यवोजिष्यका तालिम .....	19
सरसफाइ, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनधेतना सम्बन्धी तालिमहरू .....	20
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभा र लगायत प्राविधिक तालिमहरू .....	20
आठबिसकोट नगरपालिका/नगरपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू .....	20
अनुसूची २.२: गतवर्ष २०७९/१०८० सम्मको पेशकी / वेरुनु बाँकीको अवस्था : .....	21
अनुसूची २.३ अन्य उल्लेखनीय सफल अध्यासहरु तथा नवीनतम पक्षहरु .....	22
अनुसूची २.४ आगामी आर्थिक वर्षको लागि कार्यदिशा .....	22
अनुसूची ३ : नगरपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु .....	23
सफलताको कथा १.....	23
"गरिबीबाट गरिमामा – गारापाखाको परिवर्तनको यात्रा" .....	23
सफलताको कथा २.....	24
समावेशी नेतृत्व र साझा प्रयासको उत्कृष्ट नमूना — डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना.....	24
सफलताको कथा ३.....	25
महिला नेतृत्वमा साकार भएको सिमबजार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना.....	25
अनुसूची४: भिजिविलिटी .....	26
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण .....	26
सम्पादित क्रियाकलापहरुका तस्विरहरुका झलकहरु:.....	27



### आर्थिक वर्ष २०८०/८१को प्रगतिको सारांश

स्थानीयतहकोनाम:	आठविसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम भाग				
परियोजनाकोनाम:	सबैको लागिदिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना				
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावण २०८१ देखि ३१ अषाढ २०८२ (17 July 2024 To 2025 July 15)				
<b>१. आर्थिक प्रगति सारांश</b>					
परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृनिकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	पुँजीगत:	63283279	NA	43947678.45	69.45%
	कार्यक्रम / चालु:	21804721	NA	13,543,587.81	62.12%
	जम्मा:				
	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	19100000	10955291.28	10955291.28	52
	नेपाल सरकार	46488000	38318453	38318453	82
	दातृ निकाय (GoF / EU)	19500000	8217521.98	8217521.98	42
	जम्मा (MWF):	85088000	57217521.98	57217521.98	67.56
	उपभोक्ताको (Cash)	1921664.24	NA	2259577.26	118%
	उपभोक्ताको (Kind)	20712708.87	NA	11564382.8	56%
	जम्मा (उपभोक्ता):	22634373	NA	13823960	61%
	जम्मा:	107722373.1		71315226.32	66%
कुल जम्मा		95,890,741.55		6910478399	72.1%



## 2. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: आयोजना संचालित पालिकामा दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा र तैंगिक, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि सक्षम/सबल बाताबरण र शासन सुदृढिकरण भएको हुनेछ।

क्षेत्र	आ.व. २०८१/८२ को लक्ष्य	आ.व.२०८१/८२को उपलब्धि	सुन्ना को हालसम्पर्को उपलब्धि
वास व्यवस्थापन समिति गठन तथा परिचयात्मक गोष्ठी	१	१	१
वासइकाइ कर्मचारी भन्ने	१	१	१
वासइकाइ तालिम	१	१	१
वासव्यवस्थापन समिति क्षमता विकास	१	१	१
वासव्यवस्थापन समिति बैठक	१२	१४	१४
वास इकाइ बैठक	१२	१७	१७
१ दिने लैंगिक उत्तरदायी बजेट तयारी कार्यशाला गोष्ठी	१	१	१
२ दिने लैंगिक उत्तरदायी बजेट तयारी कार्यशाला गोष्ठी	१	१	१
पालिकामा मर्यादित महिनवारी व्यवस्थापननीति निर्माण कार्यशाला १ दिने	१	१	१
वास प्लान अधावधिक गर्ने कार्य	१	०	०
एन वास मोबाइल एप्लिकेशन तालिम सञ्चालन	१	१	१
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन तयारी वा पुनरावलोकन	१	१	१
विधान, प्रमाणपत्र तयारी तथा प्रीन्ट	१	१	१
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति तालिम	१	१	१
वास इकाइ कर्मचारीलाई खानेपानी संचालन तथा मर्मत सम्बन्धि तालिम २दिने	१	१	१
आठविसकोट नगरपालिकाका कर्मचारी, वडा कार्यालय, खापा उ.स. हरुका लागि मर्मतसम्भार सम्बन्धि १ दिने तालिम	१	१	१
आठविसकोट नगरपालिकाका कर्मचारीहरुका लागि १ दिने LISA सम्बन्धी अभियुक्तिकरण	१	१	१
AWIS - Annotated Water Integrity Scan कार्यशाला	१	१	१
<b>अन्य सूचकांकहरू:</b>			
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी योजना घोषणा	०	०	०
खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पूर्णसरसफाइयुक्त घर संख्या	२५५	१९०	१९०
<b>School WASH (3 – Star model)</b>			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	४	४	४
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	४	०	०
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	४	०	०
<b>तालिम, गोष्ठीतथा अभियानहरू:</b>			
खानेपानी, पानीगुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजना स्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	१२	१२	१२
खानेपानी, पानीगुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आठविसकोट नगरपालिका तथा वडा स्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	६	६	६

निर्वाचित  
निर्वाचित




**नतिजा २: आयोजना संचालित पालिकाहरुमा जलवायु उत्थानशिल, सुरक्षित र नियमित खानेपानी आपूर्ति भएको हुनेछ।**

क्षेत्र	आ.व. २०८१/८२ को लक्ष्य	आ.व. २०८१/८२को उपलब्धि	सुख्वाको हालसम्मको उपलब्धि
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC & IPC*)	१६	१४	१४
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	१६	१४	१४
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC & IPC*)	४३७	४०४	४०४
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	४३७	४०४	४०४
संस्थागत शौचालय (IPC & IPC*)	४	४	४
संस्थागत शौचालय (IPO)	४	४	४
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरु:	२५३	२०२	२०२
हातधुने स्थान (घरसंख्या)	४९४	५०२	५०२
चांग (घरसंख्या)	०	२०२	२०२
<b>गोष्ठी तथा अभियानहरु:</b>			
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी भौतिक क्रियाकलापहरु	६	५	५
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१०	१०	१०
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोपजोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी आठविसकोट नगरपालिका तथा वडा स्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	१	१

**नतिजा ३: दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता र मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन**

क्षेत्र	आ.व. २०८१/८१२ को लक्ष्य	आ.व. २०८१/८२को उपलब्धि	सुख्वाको हालसम्मको उपलब्धि
३ दिने पूर्ण सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षणतालिम	१	१	१
सामुदायिक कार्ययोजना तयार गर्ने पश्चात टिंगरिङका कार्यक्रमसञ्चालनका लागि वार्ड वास सि सि संग बैठक तथा कार्य योजना तयारी	१	१	१
श्रव्य दृश्य सामाग्री तयार तथा वितरण	१	१	१
मिस्त्रीहरुका लागि शौचालय निर्माण सम्बन्धी तालिम	१	१	१
होर्डिङ बोर्ड निर्माण तथा प्रदर्शन	१	१	१
पालिका स्तरीय सप्लायर्स, खास्स निकाय, वडा प्रतिनिधि को बिचमा कार्यशाला	१	१	१
स्थानीय स्तरमा रहेका सप्लायर्स तथा व्यवसायीहरुबाट सरसफाइका सामग्री तथा प्राविधिक विकल्पहरुको सम्प्रेषण	१	१	१
हात धुने स्थानको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि समुदाय स्तरमा तालिम	१	१	१
खास्स व्यवस्था विभिन्न दिवसहरु मनाउने (विश्व चर्चा दिवस, विश्वहात धुने दिवस, विश्व खानेपानी दिवस, राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह, मर्यादित महिनावारी दिवस इ.)	१०	५	५
समुदायस्तरको अनुगमन समितिबाट समुदायको सरसफाइ अनुगमन	८	८	८

राज्यपाल  
प्रधानमन्त्री



वि व्य स लाइ विद्यालय सरसफाइ सम्बन्धि अभियुक्तिकरण र विद्यालय खासगंभीर समिति गठनर पुनर्गठन र तिन तारे पद्धति सम्बन्धि अभियुक्तिकरणर तिन तारे पद्धति अनुसार स्वमुल्याकृत	४	३	३
विद्यालय खासस्व समिति गठनर पुनर्गठन	४	३	३
सामुदायिक विद्यालयहरुमा जिन तारे पद्धति सम्बन्धि १ दिने अभियुक्तिकरण	४	३	३
विद्यालयमा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालनकोलागी सहयोग तथा सहजीकरण	४	२	२
१ दिने मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि अगुवाहरुकालागि कार्यशाला गोष्ठी	१	१	१
२ दिने मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि अगुवाहरुकालागि तालिम	१	१	१

### आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

#### १ पृष्ठभूमि

सबैका लागी दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (SUSWA) आयोजना नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकार विचको द्विपक्षिय समझौता अनुसार संचालित आयोजना हो । सुस्वा आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखी यस नगरपालिकामा कार्यान्वयनमा आएको हो । कर्णाली प्रदेशका क्रमशः दैलेख सुखेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम भाग, जाजरकोट, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा र हुम्ला गरि १० जिल्लाका पहिचान गरिएका ४२ पालिकामा सञ्चालन गरिने यस आयोजनाका ३ वटा परिणाम क्षेत्र रहेको छ जस अन्तर्गत पहिलो परिणाम क्षेत्र अन्तर्गत सबैका लागी खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाका लागि लैड्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागी सक्षम वातावरण निर्माण गरि शासनमा सुदृढिकरण गर्ने, दोश्रो परिणाम क्षेत्र अन्तर्गत जलवायु उत्थानशिल सुरक्षित र निरन्तर खानेपानीको आपुर्ति र तेश्रो परिणाम क्षेत्र अन्तर्गत दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता र महिनावारी व्यवस्थापन रहेको छ ।

- ❖ नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सैंगे नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय सरकारका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।
- ❖ यस नगरपालिकामाआयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०८० साल चैत्र महिनामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा आयोजनाको स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा किटान गरिएका लक्ष्य वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरूलाई विष्लेशण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
- ❖ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आयोजना अन्तर्गत कुल बिनियोजित रकम निकासा भै ७२.१% प्रतिशत खर्च भएको छ । जस मध्ये दातृ निकाय तर्फको ११२८२४७८१४ रकम खर्च हुन नसकी बैक मार्फत फिर्ता पठाइएको छ । स्थानीय सरकारको विनियोजित रु. १०९१००००० मध्ये रु. १०९५५२९१.२८ खर्च भएको छ ।
- ❖ तर्जुमा गरिएका १९ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरु मध्ये १७ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन भने २ वटा खानेपानीको मर्फत योजना र १ वटा विद्यालय शौचालय निर्माण कार्य अन्य परियोजनाहरुबाट काम अगाडि बढाएको, समुदायमा आपसमा विवाद समाधान नभएको र मुहानमा पानीको स्रोतको अपर्याप्ति कारण उक्त योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
- ❖ यस प्रतिवेदनमा आठविसकोट नगरपालिका सुस्वा आयोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

निम्नलिखित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



व्यवस्थापन समिति तथा आयोजना सहयोग इकाई/आयोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा आयोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

## २. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी

### २.१ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजनाको कार्यन्वयन प्रगति:

- आठबिसकोट नगरपालिकाको तयार भएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनालाई आधार मानेर खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु क्रमशः प्राथामिकिकरण अनुसार कार्यान्वयनको चरणहरु पार गरी सम्पन्न भएका छन् । पालिका तथा दाताहरुको सिमित स्रोत र साधनहरुको प्रयोग गरी क्रियाकलापहरु संचालन भइरहेका छन् ।

#### २.१.१. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरु योजनाको कार्यन्वय सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- आ ब २०८१/०८२ मा यस आठबिसकोट नगरपालिकामा ७ वटा नयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु, ७ वटा मर्मतका खानेपानी योजनाहरु र ३ वटा संस्थागत शौचालय योजनाहरु गरी जम्मा १७ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।

#### २.१.२. योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- यस आर्थिक बर्षमा नयाँ ७ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माण सम्पन्न भइ ४०४ घरधुरीका २४५५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
- यस आर्थिक बर्षमा ३ वटा संस्थागत प्रयोगमैत्री शौचालय योजनाहरु निर्माण भइ योजनाबाट विद्यालयका बिद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी गरी जम्मा १२२८ जना लाभान्वित भएका छन् ।
- निर्माण सम्पन्न खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुमा इनलाइन क्लोरिनेशन जडान गरी शुद्ध पानीको उपलब्धता भएको छ ।
- यस आर्थिक बर्षमा ४७८ वटा घरायसी शौचालयहरुको स्तर उन्नती भएको छ ।
- ५०२ भन्दा बढि घरधुरीहरुमा हात धुने स्थान निर्माण भएका छन् ।
- ४५५ घरधुरीहरुमा चाड तथा जुठेन निर्माण भएका छन् ।
- १९० घरधुरीहरुलाई सफा स्वच्छ तथा पुर्ण सरसफाइ उन्मुख घरधुरीहरुको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

#### २.२ भौतिक प्रगति

यस आठबिसकोट नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागातरूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- गुडगुडे खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १, डिसी २ वटा, आरभिटी ३ वटा र धारा २९ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । साथै सुरक्षित खानेपानिका लागि इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- डाङागाउ फारुला खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १, डिसी २ वटा, आरभिटी ४ वटा र धारा ४२ वटा गरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य भएका छन् । साथै सुरक्षित खानेपानिका लागि इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- रिठा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक २, डिसी १ वटा, आरभिटी २ सोयल सिमेन्ट टेक १, अप्टेक ६ र धारा ३६ वटा गरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । साथै सुरक्षित खानेपानिका लागि इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- माझगाउ खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १, आरभिटी १ वटा, स्कुल धारा १ र निजि धारा ६८ वटा गरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । साथै सुरक्षित खानेपानिका लागि इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।

राज्यपाल द्वारा  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



- सिमबजार खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १ ,आरभिटी १ वटा, आरभिटी १ वटा मर्मत र निजि धारा ११ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । साथै सुरक्षित खानेपानिका लागि इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- लाँता गगुनपानी जेबिचवर खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक २ ,डिसी २ वटा ,आरभिटी ४ वटा र धारा ११२ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । साथै सुरक्षित खानेपानिका लागि इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- गरापाखा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १ ,डिसी १ वटा ,आरभिटी २ वटा र धारा १५ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । साथै सुरक्षित खानेपानिका लागि इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- सिमखोली मर्मत खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १ वटा निर्माण , बिपिटी १ वटा निर्माण आरभिटी निर्माण १ वटा र सार्वजनिक धारा निर्माण ६ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- सल्लेरी मर्मत खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १ वटा निर्माण , सिसि १ निर्माण आरभिटी मर्मत १ वटा र सार्वजनिक धारा निर्माण ६ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- महरच्चवर मर्मत खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १ वटा निर्माण , आरभिटी मर्मत १ वटा र सार्वजनिक धारा निर्माण ६ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- थर्केनी खोला मर्मत खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा इन्टेक १ वटा निर्माण , आरभिटी निर्माण १ वटा र सार्वजनिक धारा निर्माण ३ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- पाठा गाउँ मर्मत खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा आरभिटी मर्मत १ वटा ,डिसी निर्माण १ सार्वजनिक धारा निर्माण १० वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- पहाडा तलिगाउँ मर्मत खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा आरभिटी मर्मत २ वटा ,डिसी मर्मत १ गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- लिस्ने रागीला मर्मत खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा आरभिटी निर्माण १ र १ मर्मत , सार्वजनिक धारा निर्माण ६ वटा गरि सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै इनलाइन क्लोरिनेशन पनि जडान गरिएको छ ।
- संस्थागत शौचालयहरू ३ वटा निर्माण भएका छन् ।

#### तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरू	१६	५२४५	१४	४८२५	८७.५	९२
२	संस्थागत चर्पीहरू (संख्या)	४	८२३	३	६७३	७५	८२
५	हातधुने स्थान निर्माण	४९४	२९६४	५०२	३०२५	१०२	१०२
६	शौचालयहरूको स्तरोन्तती	३८७	२३२५	४०१	२४१५	१०३	१०३

#### तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	योजनाको नाम	योजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी तथा सरसफाइ	लाँताजेबीचौर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागि दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाबाट ११२ घरधुरीमा व्यक्तिगत धारा जडान भइ ७८४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



२५

Page 9 of 31  
तिवेदन (२०८१/८२)



१२	खानेपानी मर्मत योजना	पाटागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागी दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण कार्य संचालन भइरहेको यस योजनाबाट ११६ घरधुरीमा व्यक्तिगत धारा जडान हुने र जम्मा ६९६ वटा धारा जडान भएका छन् ।
१३	खानेपानी मर्मत योजना	लिस्त्रेरागिला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागी दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण कार्य संचालन भइरहेको यस योजनाबाट ७० घरधुरीमा व्यक्तिगत धारा जडान घरधुरीमा व्यक्तिगत धारा जडान भइ जम्मा ३८५ वटा धारा जडान हुने छन् ।
१४	खानेपानी मर्मत योजना	थार्केनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागी दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण कार्य संचालन भइरहेको यस योजनाबाट २३ घरधुरीमा व्यक्तिगत धारा जडान भइ घरधुरीमा व्यक्तिगत धारा जडान भइ जम्मा ९२ जनसंख्या वटा धारा भएका छन् ।
१५	संस्थागत शौचालय	बालकल्याण माध्यामिक विद्यालय संस्थागत शौचालय योजना	आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागी दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको संस्थागत शौचालय निर्माण योजनाबाट ४३ छात्रा ४० छात्र र ५ शिक्षक कर्मचारी गरी जम्मा ८८ लाभान्वित भएका छन् ।
१६	संस्थागत शौचालय	जनज्योति आधारभूत विद्यालय संस्थागत शौचालय योजना	आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागी दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको संस्थागत शौचालय निर्माण योजनाबाट ७६ छात्रा १५२ छात्र र ७९ शिक्षक कर्मचारी गरी जम्मा १५५ लाभान्वित भएका छन् ।
१७	संस्थागत शौचालय	नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय संस्थागत शौचालय योजना	आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागी दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको संस्थागत शौचालय निर्माण योजनाबाट २२१ छात्रा २०९ छात्र र १५ शिक्षक कर्मचारी गरी जम्मा ४३० लाभान्वित भएका छन् ।

तपशिल बमोजिमको कारणले लक्ष्य गरिए बमोजिमका योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

#### तालिका २.३: लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	कार्यन्वयन गर्न नसकिएका लक्षित गरिएका खानेपानी योजनाहरुको नामहरु	लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	बाघदुल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	सम्बन्धित वार्डका वार्ड सरकारबाट उपभोक्ताहरुको आपसी असन्तुष्टिहरु र ढन्दहरु व्यवस्थापन गर्न नसक्नु	उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्नु पुर्व सामाजिक असन्तुष्टिहरु र ढन्दहरु पहिचान गर्नु पर्ने ।
२	कोटखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	सम्बन्धित वार्डका वार्ड सरकारबाट उपभोक्ताहरुको आपसी असन्तुष्टिहरु र ढन्दहरु व्यवस्थापन गर्न नसक्नु	
३	लाँता खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	पुर्व सहमति भएको मुहानको बिषयमा मुहान विवाद भए पछि लाता खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य भइरहेको समयमा मुहान तोडफोड	उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्नु पुर्व सामाजिक असन्तुष्टिहरु र ढन्दहरु पहिचान गर्नु पर्ने ।

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



४ श्री सूजना आधारभूत विद्यालय  
वडा नं १४

तथा समुदायमा आपसी झन्दू हुँदा १४४  
घरधुरीहरूमा डिजाइन भएकोमा अन्ततः ११२  
घरधुरीहरूमा मात्र सिमित भएको ।  
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भवन  
सहित शौचालय निर्माण हुने भएकोले

### २.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस आठबिसकोट नगरपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ❖ खानेपानी तथा सरसफाइ र संस्थागत शौचालय निर्माण योजना लगायत योजनाहरूमा आयोजनाको चरणवद्ध कार्यपद्धति अनुसार विभिन्न क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू संस्थाचलन गरिएको थियो । ती क्रियाकलापहरू संचालन गर्दा ७४२२ महिला र ४८७५ पुरुष गरी जम्मा १२२९७ जना महिला पुरुषको सहभागिता भएको थियो ।
- ❖ जिल्ला, आठबिसकोट नगरपालिका, वडा तथा वस्ति स्तरमा सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरू संचालन भएका थिए । ती तालिम तथा गोष्ठीहरूमा ३१३० महिला र २२२१ पुरुष गरी जम्मा ५३५१ जनाको सहभागिता भएको थियो ।
- ❖ जिल्ला तथा आठबिसकोट नगरपालिका स्तरमा समुदाय स्तरका विभिन्न प्राविधिक तालिमहरू संचालन गरिएको थियो । ती तालिम तथा गोष्ठीहरूमा १४ जना महिला र २३ जना पुरुष गरी जम्मा ३७ जनाको सहभागिता भएको थियो ।
- ❖ आठबिसकोट नगरपालिका स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकलन तथा विपत जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी अभियुक्तिकरण कार्यक्रम लगायत अन्य विविध तालिमहरू सम्पन्न भएको थियो । ती तालिम तथा गोष्ठीहरूमा ५३ जना महिला र २०९ जना पुरुष गरी जम्मा २३२ जनाको सहभागिता भएको थियो ।

### तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	PWD महिला	PWD पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	४२	२३	१४	१२	३४	३५	३	०	९०	७०
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू	१२	९	१	४	१८	२६	०	०	३१	३९
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना कार्यान्वयन संग सम्बन्धित तालिमहरू	२४४	१७०	१२८	११४	६२९	५२०	०	०	१००१	८०४
जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू	१७	१४	७	१४	१७	३५	०	०	४१	६३
आठबिसकोट नगरपालिका/नगरपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू	१०	२६	१८	३१	२५	१५२	०	०	५३	२०९

Page 11 of 31

आठबिसकोट नगरपालिका, सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको बारिंग प्रगति प्रतिवेदन (२०८१/८२)

राजेश राजेश राजेश  
नि. प्रमुख प्रशासनीय वाक्यात



दिवस तथा अभियानहरु	४११	२९४	३१५	२१०	१३४४	८९६	३९	२६	२०७०	१४००
जम्मा:	७३६	५३६	४८३	३८५	२०६७	१६६४	४२	२६	३२८६	२५८५

### अनुगमन तथा प्रतिवेदन

आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमाआ ब २०८१/०८२ मा संचालित योजना तथा क्रियाकलापहरुको आठबिसकोट नगरपालिका अनुगमन समिति तथा आयोजनाबाट विभिन्न समयमा अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको थिए।

#### तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजना स्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	घरणवद्द कार्यपद्धति वर्मोजिम गर्नुपर्ने स्थलगतअनुगमन संख्या	स्थलगतअनुगमन गरिएको संख्या	आठबिसकोट नगरपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१.	लौताजेबीचौर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	४
२.	गारापाखा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	४
३.	सिमबजार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	४
४.	माझगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	४
५.	डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	४
६.	रिठा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	२	४
७.	गुडगुडे खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	४
८.	सल्लेरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
९.	मठचोर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
१०.	सिमखोली खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
११.	थार्केनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
१२.	पाटागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
१३.	पाहाडातलीगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
१४.	लिस्ने रागिला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
१५.	बालकल्याण माध्यामिक विद्यालय संस्थागत शौचालय योजना	२	२	४
१६.	जनन्योति आधारभूत विद्यालय संस्थागत शौचालय योजना	२	२	४
१७.	नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय संस्थागत शौचालय योजना	२	२	४
जम्मा				

#### तालिका ३.२: नगरपालिकाबाट आयोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्ने नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिकआर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	८	८	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	२	२	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
जम्मा				

नि. प्रमुख प्रासादीय अधिकृत



### तालिका ३.३: अनुगमनमा ऑल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०८०।०।२९ देखी २०८०।०७।०४	खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूको डिजाइन तथा इस्टिमेट अनुसार क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने । निर्माण सामाग्रीहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिने ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुगमन टोलीको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको ।</li> </ul>
२	२०८१।०।०।०३। देखी ०७ गते सम्म	<ul style="list-style-type: none"> <li>सम्झौता अनुसारका क्रियाकलापहरु सम्पन्न गर्ने ।</li> <li>योजनाका खाताहरु व्यवस्थित तवरले राख्ने ।</li> <li>सरसफाइका क्रियाकलापहरूलाई पनि सगै अगाडी बढाउने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुगमन टोलीको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको ।</li> </ul>
३	२०८१।०।०।०२। देखी ०७ गते सम्म	<ul style="list-style-type: none"> <li>अन्तिम किस्ता निकासिका लागी अन्तिम विल भर्पाइहरु तयार गर्ने ।</li> <li>योजनाहरूको दिगोपनाको लागी पानी सुरक्षा योजना र मर्मत सम्भार कार्यविधिको तयार तथा कार्यान्वयन गर्ने ।</li> <li>पूर्ण सरसफाइ क्रियाकलापहरूको निरन्तरता दिने ।</li> <li>इनलाइन क्लोरिनेशनको दिगोपनाको लागी नियमित हेरफेर गर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुगमन टोलीको सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिएको ।</li> </ul>

### प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

आठबिसकोट नगरपालिका सबैको लागी दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना अन्तर्गत संचालित क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको लागी योजना तर्जुमा तथा सम्पादित क्रियाकलापहरूको प्रगती समिक्षा गरीको छ । यस कार्यले क्रियाकलापहरूको गुणस्तरियता तथा दिगोपनामा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

**तालिका ४.१: आठबिसकोट नगरपालिका/नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समितिको बैठक**

बैठक नं	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०८१।०५।०५	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहिलो किस्ता माग गर्ने सम्बन्धमा ।</li> </ul>
२	२०८१।०५।१८	<ul style="list-style-type: none"> <li>वास इकाईको कर्मचारी नियुक्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।</li> </ul>
३	२०८१।०७।३०	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना सञ्चालनमा छुटेका नजिकैका बस्तीहरूको खानेपानी योजनाम समेत्नु पर्ने सम्बन्धमा ।</li> <li>वास फोकल पर्सनको जिम्मेवारी सम्बन्धमा ।</li> </ul>
४	२०८१।०८।२४	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक कार्य सम्पादन तथा आगामी महिनाको कार्य योजना सम्बन्धमा</li> </ul>
५	२०८१।०८।२५	<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थागत शौचालय संभाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा ।</li> <li>संभाव्यता अध्ययनका लागि खानेपानी योजना छनौट सम्बन्धमा ।</li> <li>यस आब २०८१।०८।२ मा सम्पन्न गर्ने थप नयाँ खानेपानी योजना छनौट सम्बन्धमा ।</li> </ul>
६	२०८१।०९।२५	<ul style="list-style-type: none"> <li>गत महिनाको वास इकाईको भएको खर्च अनुमोदन सम्बन्धमा ।</li> <li>खानेपानी योजनाहरूको संभाव्यता अध्ययन तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा ।</li> </ul>



७	२०८११०१२४	● मासिक प्रगतिको समीक्षा तथा आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा ।
८	२०८१११०३	● मासिक प्रगतिको समीक्षा तथा आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा ।
९	२०८१११०३	● मासिक प्रगतिको समीक्षा तथा आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा । ● मोटरबाइक मर्मत इन्धन तथा यातायात खर्च सम्बन्धमा ।
१०	२०८१०२१०७	● मासिक प्रगतिको समीक्षा तथा आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा ।
११	२०८१०२१०७	● लाँता गगुनपानी तथा जेबीचौर खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको कलेक्सन च्यामबर तोडफोड सम्बन्धमा ।
१२	२०८१०२१०९	● लाँता गगुनपानी तथा जेबीचौर खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको कलेक्सन च्यामबर तोडफोड सम्बन्धमा भएको क्षति सम्बन्धमा ।
१३	२०८१०३०७	● बार्षिक कार्ययोजना तथा लागत साझेदारी अनुमोदन सम्बन्धमा ।

तालिका ४.१: आठविसकोट नगरपालिका/नगरपालिका खानेपानी , सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समिति तथा वास इकाइको बैठक तथा निर्णयहरु

बैठक नं	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०८१०५१०	❖ कार्यक्षेत्र बाँटफाँट सम्बन्धमा
२	२०८१०५१८	❖ दशैको शुभकामना आदान प्रदानका साथै फिल्डको प्रगति समीक्षा ❖ दशै अगाडी गरिने कार्यहरुको कार्य योजना निर्माण
३	२०८१०८।२	❖ GEDSI Audit र सरसफाइ बजारीकरण र स्थानीय स्रोत व्यक्ति छनौटमा महिलालाई छनौटमा प्राथमिकतामा राख्ने सम्बन्धी छलफल तथा निर्णयहरु गरेको
४	२०८१०८।२३	❖ Online Reporting Orientation for MIS गरेको सम्बन्धी निर्णय गरेको ।
५	२०८१०८।२३	❖ सुस्वा सुशासन बिज्ञ श्री निराजन श्रेष्ठ ज्युको उपस्थितिमा वास इकाइको प्रगति समिक्षा गरिएको निर्णय गरेको ।
६	२०८१०८।२३	❖ प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको समीक्षा सम्बन्धमा । ❖ चरणबद्ध क्रियाकलापहको कार्य योजना सम्बन्धमा ।
७	२०८१०८।२३	❖ प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा । ❖ वास प्राविधिक र सामाजिक परिचालकको कार्य क्षेत्र सम्बन्धमा । ❖ मासिक कार्य योजना सम्बन्धमा ।
८	२०८१०९।२९	❖ प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा । ❖ CSM सम्बन्धमा । ❖ SIP सम्बन्धमा । ❖ स्पष्टीकरण सम्बन्धमा । ❖ स्थलगत अध्ययन सम्बन्धमा । ❖ कार्यक्षेत्र हेरफेर सम्बन्धमा ।
९	२०८११०।२९	❖ WSP+++सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन सम्बन्धमा । ❖ IEC-BCC सामग्रीहरुको प्रकाशन सम्बन्धमा ।

आठविसकोट नगरपालिका , सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०८१/८२)



- ❖ पालिकास्तरीय पुर्ण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यशाला सम्बन्धमा ।
  - ❖ गारापाखा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको पहिलो सार्वजनिक परीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धमा ।
  - ❖ दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
  - ❖ विद्यालय वास सम्बन्धमा ।
  - ❖ जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धमा ।
- |    |           |   |
|----|-----------|---|
| १० | २०८१।१।१८ | ❖ श्री नारायण सिंह खवास, प्राविधिक विज्ञ सुस्वा आयोजनाको उपस्थितिमा यस पालिका भएको आयोजनाको प्रगतिबारेमा पुर्ण अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको निर्णय गरियो । |
| ११ | २०८२।०।२४ | ❖ SUSWA Project Support Unit को AMO Mr. Surjan Rokaya को उपस्थितिमा MWF Monitoring Findings and Feedback Sharing Meeting सम्पन्न भएको निर्णय गरियो ।    |
| १२ | २०८२।०।३१ | ❖ प्रगति समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा ।  |

तालिका ४.२ यस आर्थिक बर्षमा परिचालन गरिएका स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरुको सुची

S.N.	Name of LRP	Address	Position	जम्मा योगदान (महिनामा)
१४	श्री सुनिता पुरी	आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम भाग	SMLRP	६
१५	श्री सपना खड्का	आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम भाग	DMM	६
१६	श्री अस्मिता बि क	आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम भाग	DMM	६

२०८२।०।२४  
कल्पना राज्य प्रशासकीय अधिकारी  
कल्पना राज्य प्रशासकीय अधिकारी  
कल्पना राज्य प्रशासकीय अधिकारी



## नीति तर्जुमा

आठबिसकोट नगरपालिकाको कार्यपालिका तथा नगर सभाबाट खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन पास गरिनुको साथै निम्नानुसारका आयोजना सँग सरोकार राख्ने थप निति तथा नियमहरु पारित गरिएको छ ।

- यस आठबिसकोट नगरपालिकामा ‘एक घर एक धारा’ नीति मार्फत स्वच्छ खानेपानी तथा पूर्ण सरसफाइ युक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- खानेपानी आयोजनाहरुको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि आठबिसकोट नगरपालिका र सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको लागत साझेदारीमा खानेपानी योजना निर्माण र पुराना आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका साथै प्रयोगमैत्री शौचालय लगायतका संरचना निर्माणमा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- नेपाल सरकारको नीति बमोजिम यस आठबिसकोट नगरपालिकालाई वि.सं. २०८४ असार मसान्तसम्म पूर्ण सरसफाइ उन्मुख पालिका घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । साथै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख क्रियाकलाप संचालनका लागि विभिन्न साझेदारी संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ ।
- यस पालिकाका सबै वडामा संचालन भएका योजना र संचालन हुने योजनाको खानेपानी स्वच्छ र गुणस्तर कायम गर्नका लागि आठबिसकोट नगरपालिकामा खानेपानी ल्याब स्थापना कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।

## आठबिसकोट नगरपालिकाले नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को आय तथा व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्य प्रस्तुत

### भएको नगरपालिकाबाट खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रगतिको शारांश

आठबिसकोट नगरपालिका वास इकाईबाट सञ्चालित “सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा)आयोजना” अन्तरगत सुरक्षित खानेपानीको लागि “एक घर एक धारा निर्माण” कार्यका लागि आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं ७, ११ र १३ भित्रका ७ वटा नयाँ खानेपानी योजनाहरूका ४०४ घरधुरीहरु र वडा नं १, २, ३, ४, १०, ११ र १४ का ७ वटा पुराना खानेपानी योजनाहरूको विस्तारित खानेपानी योजना अन्तर्गत “इनलाइनक्लोरिनेशन” जडान गरि मर्मत गरी ३७५ घरधुरीहरूलाई दिगो रूपमा सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

त्यसैगरी ३ वटा विद्यालयहरूका ७१३ शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुने गरी प्रयोगमैत्री शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछन् । यसैगरी आठबिसकोट नगरपालिका नगरपालिकाको वास तर्फको शासन सुदृढिकरणको लागि नगरपालिकाबाट वास ईकाईको विधिवत रूपमा स्थापना तथा स्थागत बिकास तथा वास इकाई/सुस्वा आयोजनाको सहजीकरणमा आठबिसकोट नगरपालिकाको खानेपानसरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन २०८१, आठबिसकोट नगरपालिकाको मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१, आठबिसकोट नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ योजना मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१, आठबिसकोट नगरपालिकाको लैंगिक उत्तरदायी तथा अपाङ्गता समावेशी पञ्च वर्षिय योजना तर्जुमा २०८१ (२०८१ देखि २०८५ सम्म), आठबिसकोट नगरपालिकाको संस्थागत संरचना व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८१, आठबिसकोट नगरपालिकाको पुर्ण सरसफाइ प्रबद्धनका लागि स्थानीय तहको कार्य योजना २०२५, नगरपालिकाबाट पारित भइ लागु हुनुको साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा समुदायलाई क्षमता विकासका विभिन्न ३ दर्जन बढी तालिमहरु प्रदान गरिएको छ । ९ वटा पुराना खानेपानी योजनाहरूमा खानेपानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिमहरु प्रदान गरिएको, ९ वटा खानेपानी सुरक्षाको प्रतिवेदन तयार गरिएको, १४ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेको साथै आठबिसकोट नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका घोषणाको लागि वडा नं ६ त्रिवेणी बस्तीलाई नमूना बस्ती निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको र आयोजना सञ्चालन भइरहेका घरधुरीहरूमा पुर्ण सरसफाइका सुचकहरु पुरा गर्ने कार्यहरु भइरहेको छ । यसैगरी यसै आ.ब. मा कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास खानेपानी मन्त्रालय र यस आठबिसकोट नगरपालिका बीच ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।





#### ४. सहकार्य

तालिका ४.१: आयोजना सँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकमरु. (वावराबर)
१	आठबिसकोट नगरपालिका र महिला बालबालिका शाखा	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	कार्यक्रम संचालन तथा सहजिकरण	२०००००१००
२	नलगाड नगरपालिका	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	कार्यक्रम संचालन तथा सहजिकरण	८५०००१००
३	बातावरण तथा जनस्वास्थ संस्था (ENPHO)	पानीको गुणस्तर परीक्षण	तालिम तथा सहजीकरण	

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	समुदाय तथा जनप्रतिनिधिहरुले अपेक्षा उच्च राख्नु आम भेलामा सहमत भएका तर काम सुरु भए पछि उपभोक्ताहरुले नगद योगदान र श्रमदान गर्ने विषयमा असमत भए पछि पटक पटक विवादहरु भएको	छलफल तथा परामर्शबाट समस्याहरु समाधान गरिएको। पटक पटक आमभेला गरी उपभोक्ताहरुलाई एकतावबद्ध गरेर खानेपानी योजनाहरुका कार्यहरुमा सहभागी गराएको। समुदायमा समस्याहरु सृजना व्यक्तिहरु समेत सहभागी गराएर आयोजनाका पद्धतिहरुको बोरेमा पटक पटक विवाद समाधान गर्दै योजनाहरु कार्यन्वयन गरेको।
३	नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी खानेपानी योजनाहरुको सर्भे तथा डिजाइन कार्य	आयोजना विज्ञहरुसँगको छलफल तथा परामर्श बाट समस्याहरु समाधान गरीएको

नि. प्रमुख प्रापासकीय अधिकृत  
प्रापासकीय अधिकृत



#### ४. सहकार्य

तालिका ५.१: आयोजना सँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्यका

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकमरु. (वाबरावर)
१	आठबिसकोट नगरपालिका र महिला बालबालिका शाखा	अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस	कार्यक्रम संचालन तथा सहजिकरण	२०००००१००
२	नलगाड नगरपालिका	अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस	कार्यक्रम संचालन तथा सहजिकरण	८५०००१००
३	वातावरण तथा जनस्वास्थ संस्था (ENPHO)	पानीको गुणस्तर परीक्षण	तालिम तथा सहजीकरण	

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	समुदाय तथा जनप्रतिनिधिहरुले अपेक्षा उच्च राख्नु	छलफल तथा परामर्शबाट समस्याहरु समाधान गरिएको।
२	आम भेलामा सहमत भएका तर काम सुरु भए पछि उपभोक्ताहरुले नगद योगदान र श्रमदान गर्ने विषयमा असमत भए पछि पटक पटक विवादहरु भएको	पटक पटक आमभेला गरी उपभोक्ताहरुलाई एकतावबद्ध गरेर खानेपानी योजनाहरुका कार्यहरुमा सहभागी गराएको। समुदायमा समस्याहरु सृजना व्यक्तिहरु समेत सहभागी गराएर आयोजनाका पद्धतिहरुको बारेमा पटक पटक विवाद समाधान गर्दै योजनाहरु कार्यन्वयन गरेको।
३	नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी खानेपानी योजनाहरुको सर्वे तथा डिजाइन कार्य	आयोजना विज्ञहरुसँगको छलफल तथा परामर्श बाट समस्याहरु समाधान गरीएको

Mr. Pranab Prajapati  
राजेश गाउड  
नियमित प्रशासकीय अधिकृत

**अनुसंधानी १: यसआ.व.मा संचयालित योजनाहरुको विवरण**

क्रम	योजनाहरुको नाम	बडानं.	योजनाकोउन्नत्या नित लागत (रु. मा)	यसआ.व.मा भएको खर्च (रु.) (GaN+GaN+EU+RM)	यस योजनामा आठविसेट कार्गलिको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत खर्च जाने / नजाने (GaN+GaN+EU+RM)	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष्य	यसआ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभावधात जनसंख्या
1	लॉटोजेवीचार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	7	11343081.17	11343081.17	11343081.12	N/A	N/A	616
2	गारापाखा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	7	2274976.98	2274976.98	1291444.06	N/A	N/A	88
3	त्रिम्बजार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	11	7582943.96	7582943.96	758294.4	N/A	N/A	545
4	माझार्ड खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	11	4629999.33	4629999.33	462999.93	N/A	N/A	727
5	डॉइङ्गार्ड खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	11	449354.14	449354.14	449358.41	N/A	N/A	232
6	पिठा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	11	5173900.65	5173900.65	517390.07	N/A	N/A	192
7	गुडगाड खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	13	3270578.15	3270578.15	3270568.71	N/A	N/A	144
8	सल्लरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	11	1025441.09	1025441.09	128424.26	N/A	N/A	230
9	मठचार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	10	1335163.2	1335163.2	167073.29	N/A	N/A	118
10	त्रिसखाली खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	14	1474799.64	1474799.64	1846590.57	N/A	N/A	198
11	शाकेनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	4	813200.64	813200.64	1017105.68	N/A	N/A	114
12	पाटागाउ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	3	229080.16	229080.16	286576.86	N/A	N/A	599
13	पाहाडालतीगाउ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	2	1101333.59	1101333.59	129,598.54	N/A	N/A	574
14	तिस्ने रागिला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	1	1423655.41	1423655.41	175,471.79	N/A	N/A	294
15	बालकल्याण आधारभूत विद्यालय शोधालय योजना	13	866420.14	866420.14	221,213.65	N/A	N/A	88
16	जनन्येति आधारभूत विद्यालय शोधालय योजना	7	864111.8	864111.8	220,624.29	N/A	N/A	155
17	नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय शोधालय योजना	12	89638.4	89638.4	229,451.08	N/A	N/A	430
	जम्मा:		43947678.45	43947678.45	9362983.71			5344

राजेश खाली  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## अनुसंधी० १: यसआ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	बडा नं. हर	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य महिला	अन्य पुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणबद्द कार्यपद्धति वर्गोजिस्मका तालिम</b>										
१	आमभेला, कार्यक्रम अभियांत्रिकण तथा उ.स.गठन	७,९१,१३	२	२	१७३	१०६	११२	७६	४८०	३२०
२	उम्भोका समिति अभियांत्रिकण गोष्ठी	७,९१,१३	२	२	१७३	१०६	११२	७६	४८०	३२०
३	बिस्तृतेरेखाचल तथा आमभेला बाट खीकूति	७,९१,१३	२	२	१७३	१०६	११२	७६	४८०	३२०
४	आर्थिक व्यवस्थापन अभियांत्रिकण गोष्ठी	७,९१,१३	२	२	१७३	१०६	११२	७६	४८०	३२०
५	खानेपानिको ग्रुप्स्ट ए(PA/Vial,कोलोरेशन) सम्बन्धि गोष्ठी	७,९१,१३	२	२	८	८	८	२	५	२५
६	खानेपानी सुख्खा योजना, विषद जोखिम न्यूनीकरण, ३R सम्बन्धि गोष्ठी	७,९१,१३	२	८	४	४	०	५	३	२०
७	उपभोक्ता समिति संग हिजाजन स्ट्रिमेट छलफल तथा सामुदायिक कार्ययोजना तथारि	७,९१,१३	२	८	१६९	१०२	११०	६५	४६५	३०५
८	आमभेला बाट हिजाजन स्ट्रिमेट तथा सामुदायिक कार्य योजना पारित	७,९१,१३	२	२	१७१	१०९	१०८	६५	४६८	३०८
९	आर्थिक व्यवस्थापन पुरातांजी गोष्ठी	७,९१,१३	१	१	१७३	१०६	११२	७६	४८०	३२०
१०	निर्माण अवधि /CAP पुनरावलोकन गोष्ठी	७,९१,१३	१	१	१५७	१३	१८	६१	४४५	२१५
११	योजनाको दोस्रो अनुग्रह तथा दोस्रो सार्वजनिक सुनुवाई	७,९१,१३	१	१	१५६	१७	१५	६३	४४८	३०३


  
 Page 19 of 31

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

आठविसेकोट नगरपालिका, सर्वको लागि दिगो खानेपानी, सरासफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको वार्षिक प्राप्तिप्रतिवेदन (२०८१/८२)

१२	योजनाको तेसो अनुगमन तथा तेसो सार्वजनिक सुनुवाई	७,९१,९३	१	१५३	१५	१३	६२	४८३	३०६
जम्मा									
		१६७६	१०२२	१०६६	६९८	४८९	३१५६		
<b>सरसफाइ, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनन्येतना सञ्चान्धी तालिमहरू</b>									
१	विभिन्न दिवस, अभियान तथा सामाजिक	आठविसकोट नगरपालिका	१	४४९	२९४	३१६	२१०	१३८८	१५६
२	खानेपानी सुरक्षा योजना तालिम	वडा नंबरह १, २, ३, ४, ५, ६, १०, ११, १४	४ वित्त	८९	३२	४	१	७२	८८
३	समुद्रवाय स्तरको संस्करण अनुगमन	७, ९१, ९३	१ वित्त	५	३	३	१	१४	१४
४	हातधुने स्थान निर्माण सञ्चान्धी अभियानकरण	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	४४२	११	१०१	१५६	४६३	३१३
५	बाउंड बास सि सो अभियानकरण कार्यक्रम	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	३	३	३	३	५	५
६	मध्याह्नित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी गोर्ही	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	९	३	६	३	५	६
७	सारोकारबालाहको समाबेसी नियत विष्टेषण तथा	आठविसकोट नगरपालिका	२ वित्त	१	३	६	३	५	१०
८	योजना तर्फमा गोर्ही	१ पालिका प्रमुख एवम प्रतिनिधिहको समाबेसी नियत विष्टेषण तथा योजना तर्फमा गोर्ही	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	१	३	६	५	१०
९	२ विं स्थानीय महिनावारी व्यवस्थापनका लागि याड नियांगा तालिम	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	१	३	६	५	१०	१०
१०	मध्याह्नित महिनावारी सञ्चान्धी महिलाहस्का लागि	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	१	३	६	५	१०	१०
११	कार्यशाला गोर्ही	१ वित्त	१	१२	१२	१२	१२	१५	१५
१२	विद्यालयहरूमा ३ तरो सञ्चान्धी अभियानकरण कार्यक्रम	वडा नं. ७, ११, १२, १४	१ वित्त	५	१५	१०	८	१५	१५
<b>स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभा र लगायत प्राविधिक तालिमहरू</b> <td data-kind="ghost"></td>									
१	मिरिलहरूका लागि शोचातय निर्माण तालिम	आठविसकोट नगरपालिका	७ वित्त	१	४	५	१	७	७
२	मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	आठविसकोट नगरपालिका	१२ वित्त	१	५	३	१	२	२
<b>जम्मा</b>									
<b>आठविसकोट नगरपालिका/नगरपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू</b>									
१	जलशाय अनुकूलन तथा विषय जोगिविम न्युनिकरण अभियानकरण कार्यक्रम	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	१	३	१	४	११	३
२	एस वास अद्यावधिक कार्यशाला गोर्ही	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	०	०	०	०	०	०
३	लिङ्जा सञ्चान्धी अभियानकरण गोर्ही	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	१	०	०	०	०	०
४	ग्रामीण खानेपानी संचालन सञ्चालन सञ्चान्धी कार्यशाला प्राप्तिका सारांशक निकायहरू विच	आठविसकोट नगरपालिका	१ वित्त	१	३	१	२	८	८

**Page 20 of 31**

आठविसकोट नगरपालिका, सर्वको लागि दिगो खानेपानी, सरसपाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०८१/८२)

*[Signature]*

नि. प्रधान प्रशासकीय दीर्घांक  
[Signature]



	कार्यगात्रा	प्रयोग करने वाली संस्था	दिन	वर्ष	कृति	वर्ष	कृति
५	GEDSI तालिम वास युनिट तालिम	कार्यालय नेपाल १००३	४ दिन	३	०	४	०
६	वास युनिट कर्मचारीहरुको प्राविधिक पुनर्जीवी तालिम		३ दिन	१	०	०	०
७	वास युनिट कर्मचारीहरुको लागी पानी सुखा योजना तालिम		४ दिन	१	०	३	०
८	वास युनिट कर्मचारीहरुको लागी N-WASH तालिम	आठबिस्कोट नारायणलिका	३ दिन	१	०	३	०
९	AWISअधिकारिकरण	आठबिस्कोट नारायणलिका	१ दिन	१	३	५	५
१०	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम	आठबिस्कोट नारायणलिका	३ दिन	१	०	१	१
११	वास युनिट कर्मचारीहरुका लागी पुर्ण सरसमाइ तालिम		४ दिन	१	३	०	१
	जम्मा			१०	२६	१८	३९
					२५	२५	१५२

### अनुसूची २.२: गतवर्ष २०७९/८० सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

Not Applicable due to this fiscal year was new Implementation year for Aathbiskot Municipality	कुल फर्डियोट पेशकी / वेरुजु रकमरु	कुल पेशकी / वेरुजु रकमरु	कुल फर्डियोट पेशकी / वेरुजु रकमरु
	०	०	०

  
X  
राजस्व विभाग  
प्रमुख प्रशासकीय विभागका  
प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय विभागका



### अनुसूची २.३ अन्य उत्तेजनाय सफल अभ्यासहरू तथा नवीनतम पक्षहरू

- ❖ नार कार्यालयिक भिन्न वास इकाईको स्थापना तथा संचालनाल
- ❖ योजना सम्बैता सौ शैक्षालयहरू निर्माण तथा पूँ सरसफाइ अभियानमा सरिक गरापाखा बस्ती महिलाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको सिमबजार खानेपानी योजना,
- ❖ दलित र अपाङ्गता भएको व्यक्तिबाट सम्पन्न भयो डॉइडाउ खानेपानी योजना,
- ❖ बनेका खानेपानी सञ्चनामा देखेर दोगा सिमखोलाका खानेपानी उपभोकाहरू,
- ❖ सामुहिक भावनाको बिकास गरायो रिठा बहुउपयोगी खानेपानी योजनाले,
- ❖ एक घर एक धारा भए पछि सरसफाइ कार्यमा उत्तमाहित लाई खानेपानी उपभोकाहरू,
- ❖ उपभोका समितिहरूले आफ्ने कार्यालय खोली कार्य सुन्नालान गरिरहेको गुणस्तरीय संचनाहरूको निर्माण,

तेरेखा व्यवस्थापन तर्फ : गिरि दुणा बालुवा संकलन तथा दुवानीमा भ्याट बिलको प्रयोग, सबैभन्दा बढी महिला तथा युवषको सहभागितमा महिलावारी स्वच्छता व्यवस्थापन बोरे सम्बन्धिक जनवेतना विस्ताराका लागि ८ मार्चको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पालिका केन्द्रमा भव्य रूपमा मनाइयो । कलाकार जानकी तारामी मार सी दर्जी कलाकारहरूको प्रस्तुतीमा झाँडे ३ हजार मानसिहरुको उमस्थिति रह्यो ।

- ❖ आठविसकोट नारायालिका बडाने ६ स्थितको त्रिबेनी पुर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन,
- ❖ रिठा बहुउपयोगी खानेपानी योजनाबाट लिविकोपार्जन तथा जलवायु उत्थानशीलता वृद्धि,
- ❖ नार पालिकाबाट वास व्यवस्थापन सम्बन्धी चिभिन ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरू र निर्देशिकाहरू जारी भइसकेको

### अनुसूची २.४ आगामी आर्थिक बर्षको लागि कार्यादिशा

- ❖ खानेपानी सरसफाइ योजनाहरूमा SSC सम्बन्धी WUSC लाई Capacity Building का तालिमहरू सञ्चालन गर्ने ।
- ❖ नारायालिकाको वास योजना अद्यावधिक गर्ने ।
- ❖ SSCअन्तर्गत पालिका र उपभोका समितिहरूसँग समझदारी प्रत्याहरूमा हस्ताक्षर गर्ने ।
- ❖ पानी गुणस्तरको प्रारम्भिकहरूको परीक्षण गरी पानीको गुणस्तर परीक्षण कारबलाई निर्दलागा दिने ।
- ❖ आ ब २०८१/८२ मा सम्पन्न खानेपानी तथा स्वच्छता योजनाहरूमा पानी सुरक्षा योजना लागु गर्ने ।

न. प्रमुख  
सामाजिक अधिकारी  
नारायालिका  
नियमावली

Page 22 of 31

## अनुसूची ३ : नगरपालिकाका नमूना उपलब्धीहु तथा सफलताका कथाहरु



### सफलताको कथा १

#### "गरिबीबाट गरिमामा – गरापाखाको परिवर्तनको यात्रा"

२०८०

स्थान: आठविसेकोट नगरपालिका वडा नं. ०७, गरापाखा बस्ती, रुकुम पश्चिम भाग

घरधुरी मञ्च्या: १६

जम्मा जनसंख्या: ८८

दलित घरधुरी: १२

सहयोगी आयोजना: आठविसेकोट नगरपालिका, वास इकाई सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई (सुन्धा) आयोजना।

सहजीकरण: वास इकाई, आठविसेकोट नगरपालिका

पहिलेको अवस्था: उपेक्षित बस्ती र उपेक्षित अवस्था

गरापाखा बस्ती कलहिल्लै पनि योजनाको केन्द्रमा पर्न सकेको थिएना १६ घरधुरीमध्ये अधिकांश विषयन र दलित समुदायका थिए।  
गरापाखा पानीको धारा थिएना।

- कुनै परमा पानीको धारा थिएना।
- कुनै परिमा शौचालय थिएनन्, अहिले सम्म पनि खुल्ला दिसा मुक्त हुन नसकेके बस्ती समस्फाई र स्वच्छताको अवस्था अल्पतरै कामजोर थियो।
- पानीको चोत थियो, तर त्यो सुविधा धरमा पुग्न सकेको थिएन।
- बस्तीको वास्तविकता पीडादारी थियो – न पानी, न सरसफाई, न स्वास्थ्य।

मोडको बिन्दू: मुख्या आयोजनाको उपस्थिति

सुन्धा आयोजनाले गरापाखा बस्तीलाई लक्षित बस्तीको रूपमा छानैट गर्न्यो।  
सुरुवात भयो साझा समझदारी र विश्वास निर्माणबाट

- दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै अध्यक्षी थी पठेकामी
- ५०% भन्दा बढि महिलाको प्रतिनिधित्व सहित

गरापाखा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन गरियो।

यसपछि सुरु भयो सशक्तिकरणको यात्रा –

- योजना बनाउने,
- तालिम लिने,
- निर्णय गर्ने,
- र परिवर्तन ल्याउने।

वास इकाइले नेतृत्व विकास, योजना व्यवस्थापन र व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्न्यो।




म. प्रमुख प्रशासकीय समिक्षा  
म. प्रमुख प्रशासकीय समिक्षा

प्रमुख  
प्रशासकीय समिक्षा



## देविएका परिवर्तनहरू:

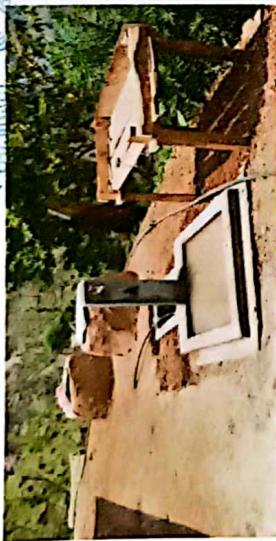

### उपभोका समितिको अग्रसरता र बस्तीको ऐक्यबद्धताले गर्दा:

- होके घरमा शौचालय निर्माण भयो र नियमित प्रयोगमा आयो ।
- सबै घरमा हात धुने स्थान, भाँडा सुकाउने चाड, र कोहोर राङ्गे खाइलहरू बनाइयो ।
- “एक घर एक धारा” अवधारणा कार्यान्वयन गरियो - अहिले सबै घरमा सफा र मुग्धित खानेपानीको थारा पुऱ्यो छ ।
- बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार, महिला तथा आमाहरूको समयको बचत र सम्मानको अनुभूति भएको छ ।

### परिणाम: गरिबीबाट गरिमामा

आज गरापाखा बस्ती पछाडि पारिएको बस्ती होइन, उदाहरणीय बस्ती बनेको छ ।

जहाँ पहिला निराशा थिए, आज त्वाँस का पारा, चिकित्सक पेका शौचालय, र मुकामसहितको आत्मगौरव छ ।

### निष्कर्ष:

आठविसकोट नगरपालिका सुख्खा आयोजना र वास इकाईको सहजीकरणमा, स्थानीय समुदायको नेतृत्व, विशेषगरी दलित र महिलाको सक्रिय सहभागिता, ले गरापाखा बस्तीमा दिगो परिवर्तन ल्याएको छ । सधै गरापाखा अब पानी र सरसफाइ को मात्र होइन, सशक्तिकरण, सम्मान र पुनर्जागरण को पनि कथा हो ।

### सफलताको कथा ?

### समावेशी नेतृत्व र साझा प्रयासको उत्कृष्ट नम्ना — डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना

योजना तथा उपभोका समितिको नाम— डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उभोका समिति ठेगाना—आठविसकोट नगरपालिका, वडा नं. ११, लुम्म पञ्चम भाग

### समिति पदाधिकारी संख्या— ९ जना

समावेशी सरचना— महिला ६ जना, पुरुष ५, दलित ४ जना र जनजाति ५ जना

नेतृत्वमा समावेशिता र संबेदनशीलता : डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उभोका समिति एक उदाहरणीय योजना हो, जसले समावेशी नेतृत्व र साझा प्रयास मार्फत समुदायमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । समितिको नेतृत्व श्री कार्णबहादुर नेपालीसिंह गुरुङलाई छ, जो स्वयं दलित समुदायका हुनुहुन्छ र उहाँ आर्के पनि अपाइयाता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । बाटी व्यवहार, दृष्टिकोण र समर्पणका हिसाबस्ते अस्तन्त प्रभावशाली र प्रेरणादायी चाकित्वर र दृढ इच्छाशक्ति, सामाजिक चेतना र समर्पणको उत्कृष्ट उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । बोली, व्यवहार र समर्पणका दृष्टिकोणले पनि उहाँ एक असल व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

समावेश नारोका प्रवृत्तिहारी सेवा प्रवाहहरा ल्याएको : सुख्मा योजना सुचार हुँदा, सहभागी हुन नचाहेका ५ (पाँच) घरधुरीहरूलाई समिति अध्यक्ष श्री कर्णबहादुर नेपालीको पहलमा सहमत गराइयो । उहाँको नेतृत्वमा ती परिवाहरूलाई पनि योजनामा समेटिएको मात्र होइन, उभीहरूको लाभि छुट्टे संरचनात निर्माण गरियो ।

जसअनुसार ५ परिवाहरूको लाभि ४ घरधुरीको आरभाटी (RVT) निर्माण समेत गरियो ।



२३  
२३

## **बिना विवाद — सहभागी र पारदर्शी कायान्वयन**

योजना कायान्वयनको क्रममा कुनै पनि विवाद हुन नदिन सबै उपभोक्ताहरूलाई श्रमदानमा प्रोत्साहित गर्नु र सबै मंत्रचनाहरूलाई ग्राविधिक डिजाइन अनुसार गणस्तरीय रूपमा निर्माण गर्नु यस समिक्षको विशेष उपलब्धि मानिन्छ । समिक्षिले उपभोक्ताबीच एकताको भावना सिर्जना गर्दै महयोग र सहभागिताको वातावरण बनायो, जसले गर्दा योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

### **सफलताका तत्वहरू— समावेशी समिति र अर्थपूर्ण सहभागिता**

- प्रारम्भमा असहमत थाएका घट्टुरालाई योजना असर्तात त्वाउने कुशल कूटनीली
- महिला, दलित, जनजाति र अन्याइनाता भयका व्यक्ति, लागायत सबै समाजपातिक समावेशिता
- सबै संरचनाहरू गुणस्तरीय रूपमा निर्माण
- विवादहित, पारदर्शी र सहभागी प्रक्रिया

यसर्थ डाडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना एउटा समावेशी, संबेदनशील र सामुदायिक नेतृत्वद्वारा सञ्चालित सफल आयोजनाको अनुकरणीय नमूना हो । श्री कर्णविहार नेपालीको नेतृत्व, समावेशी समिति र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, यस आयोजनाको ग्रामो पक्ष हो । समितिले देखाएको इच्छाशक्ति र समुदायको सहभागिता यस क्षेत्रका अन्य योजनाहरूका लागि पनि प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ ।

### **सफलताको कथा ३**

#### **महिला नेतृत्वमा साकार भएको सिमबजार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना**

आठविसेकोट नगरपालिका-११ सिमबजार खित सिमबजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले एउटा प्रेरणादायी सफलताको कथा रचेको छ — जुन साहस, सहभागिता, समावेशिता र दृढ इच्छाशक्तिको गाथा हो । समितिको सुल्वाती चरणमा, आम भेलाबाट ११ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरियो, जसमा ६ जना महिला, ५ जना पुरुष, ४ जना दलित र ५ जना जनजाती र अन्य समुदायका प्रतिनिधित्व थिए । सुखमा अध्यक्ष पदमा पुरुष निर्वाचित भए पनि कार्यान्वयनको क्रममा श्रमदान र नगद योगदानका विषयमा समुदायमा मतभेद चुनिले जाँदा अध्यक्ष श्री पैले कामीले राजीनामा दिनु पर्यो ।

योजना अन्योलमा पहुँच जाँदा, उपायक्ष पदमा हेहकी श्री तुली बुढा, जो हस्ताक्षर गर्ने साक्षर मात्र थिएन् र जनजाती समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको थिएन् — आफै नेतृत्वमा योजना अधि वडाउने औट गर्नुपर्यो उहाँको यो साहसी निर्णय नै योजनालाई नयाँ जीवन दिने मोड बन्न्यो ।

श्री बुढाको नेतृत्वमा, १२ किलोमिटर टाडाबाट पाइप ल्याइन् समुदायलाई जननश्रमदानमा सक्रिय गराउन १ प्रत्येक १९ घरधुरीमा एक घर एक धारा निर्माण गर्नु जस्तो कठिन कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिया । साथै, उहाँको पहल २ सयोजनमा समुदायले पूर्ण सरसफाइ सूचकहरू पनि पूँछ गर्दै गयो ।

शैक्षिक रूपमा पूर्ण शिक्षित नभए पनि, नेतृत्वको साहस, समाजप्रतिको समर्पण र व्यवस्थापन कोशलका कारण श्री तुली बुढा आज एक प्रेरणादायी महिला नेतृत्वका उदाहरण बन्न सफल हुनुभएको छ । उहाँको यो योगा "जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय" भन्ने भनाइलाई चरितार्थ बनाउने सफलताको गाथा हो ।

यो कथा केवल एक योजनाको मात्र होइन, महिला सशक्तिकरण, समावेशी नेतृत्व, र सामुदायिक एकताको जीवन दस्तावेज हो । सिमबजार बरसी र वाहाँका बासिन्दाले देखाएको यो सफलताको यात्रा सम्पूर्ण आठविसेकोट नारपालिका का लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको छ ।



### प्रसारण गणिको विषयवस्तु

क्र.सं.	माध्यम	मिति
१	दिवस समाह तथा अभियानहरु संचालन गणिको	दिवसहरु साथ सञ्चारित मितिहरुमा व्यानर, पर्ची, पामेलेट कार्यक्रमहरु संचालन गणिको
२	सुचना पार्टी	सञ्चारित योजना क्षेत्रहरूमा योजनाहरुको विवरणहरु उल्लेख गरिएको
३	योजना सुचना बोई, IEC/BCC सञ्चारित स्टिकर व्यानर पर्ची र पोष्टहरु प्रकाशन तथा वितरण	खानेपानी तथा सरसफाई सञ्चारित सुचनामुलक तथा व्यवहार परिवर्तन सञ्चारित जानकारीहरु
४	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०८१ पौष र फागुन
		योजनाहरुको कोटेशन प्रकाशन गणिएको

### अनुसंधान ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीकोनाम	कार्यालय	पद	जम्मा योगदान (महिनामा)
क.				
१	नरेन्द्र के सी	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास संयोजक	१०
२	बिरेन्द्र बटाला	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	प्राविधिक सहजकर्ता	१०
३	गोपाल बि सी	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास सहजकर्ता	१०
४	सुन्दर अमेली	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास प्राविधिक	१०
५	किशोर कुमार बुढा	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास प्राविधिक	१०
६	मोहन बि क	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास प्राविधिक	१०
७	दिनेश बिष्ट	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास प्राविधिक	१०
८	प्रज्वल बि क	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास प्राविधिक	१०
९	प्रकाश कुमार शाह	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	वास प्राविधिक	१०
१०	कर्णबहादुर के सी	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	सामाजिक परिचालक	१०
११	वसन्त चन्द्र	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	सामाजिक परिचालक	१०
१२	दिपक के सी	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	सामाजिक परिचालक	१०
१३	नविन चनेल	आठबिसकोट नारायणालिका, रुकुम पश्चिम भाग	सामाजिक परिचालक	१०


आठबिसकोट नारायणालिका, सर्वेको लागि दिगो खानेपानी, समसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको वार्षिक प्राप्ति प्रतिवेदन (२०८१/८२)

Page 26 of 31

न. प्रमुख प्रशासनकार्यालय  
प्राप्ति प्रतिवेदन (२०८१/८२)

सम्पादित क्रियाकलापहरुका तस्वीरहरुका झलकहरु:

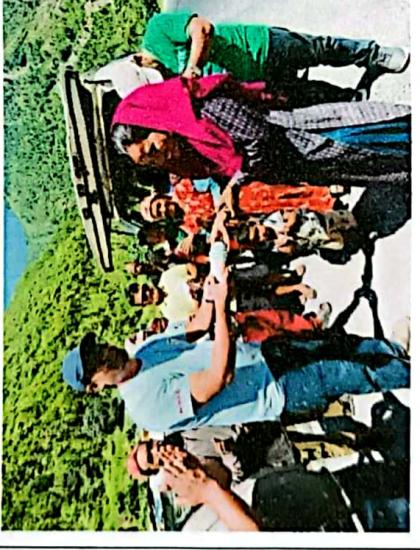

 <p>सार्वजनिक स्थलमा IEC-BCC Material को प्रयोग</p>	 <p>सिमखोली मर्मत खानेपानी योजनाको धेरवार</p>
 <p>महिलाहरु नाप गाई पाइपलाइन खन्दे गेको .....</p>	 <p>शैचालय अनुगमनमा SMLPR : सुनीता पुरी</p>
 <p>बोधि वास सम्बांधि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम</p>	 <p>रीठा बस्तीमा पुर्ण सरसफाइमा सक्रिय महिलाहरुलाई प्रेत्ताहन गाउँ चाम सल्लाहकार श्री प्रभोद लाल श्रेष्ठ</p>

गणराज्य नेपालको राष्ट्रिय स्वच्छता आयोजनाको बार्षिक प्राप्ति प्रतिवेदन (२०८१/८२)

Page 27 of 31

आठविंसीकोट नारायाणिका, सर्वोच्च लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको बार्षिक प्राप्ति प्रतिवेदन (२०८१/८२)

राजेश भट्टा  
नि. प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी

राजेश भट्टा  
नि. प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी



फिल्ड अनुगमनको क्रममा नागरिकहरू, उपभूष्य र नियन्त्रक लगायतको टोली द्वारा बहुउपयोगी खानेपानी योजनामा




१० सेमि गहिरे पाइपलाई खन्दे उपभोक्ताहरू .....

डाङाउँ खानेपानी तथा सरसफाई योजना



बडा नं ६ ब्रिवेणीमा पुर्ण सरसफाई अभियान

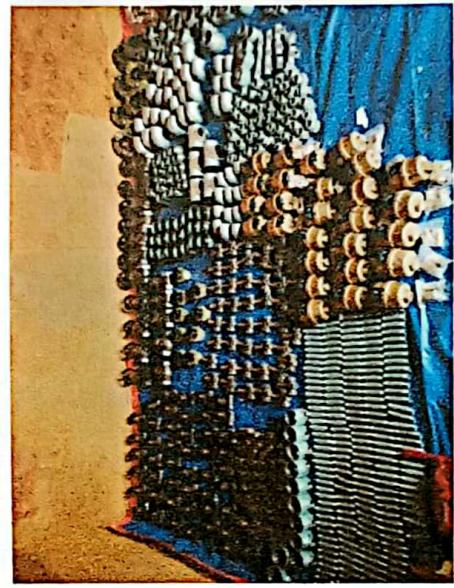

डाङाउँ खानेपानी तथा सरसफाई भण्डारण




मध्यादित महिनावारी व्यवस्थापन तथा आड निर्माण तालिम



सिमबजार खानायो आरभिट निर्माणमा तालिममा सहभागी  
Village Maintenance Workers : VMWs

राजेश प्रशासकीय अधिकारी  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

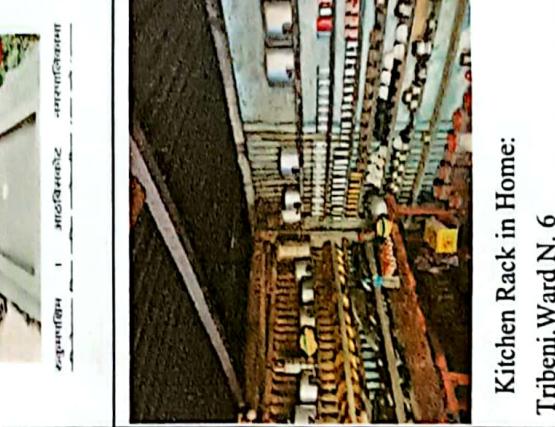	 <p>International Women Day Celebration</p>
 <p><b>आठविस्कोटका ५०० घरमुखी खानेपानी सुधिका</b>  <b>आठविस्कोटका घर घरना</b>  <b>चानूपात्रीको धारना</b></p>	 <p>Kitchen Rack in Home: Tribeni, Ward N. 6</p>
 <p><b>आज देखि सिमबजारमा एक घर एक घर सञ्चालनमा</b>  <b>लकुम पाइयम । लकुम पाइयमको आठविस्कोट ११ सिम बजारमा</b></p> <p>UJJALOPATI.COM  <b>आज देखि सिमबजारमा एक घर एक घर सञ्चालनमा</b>  <b>लकुम पाइयम । लकुम पाइयमको आठविस्कोट ११ सिम बजारमा</b></p>	 <p>प्रभागित गर्ने  ई. राजेश गोतम  निपुण प्रशासकीय अधिकारी  प्रशासकीय अधिकारी  निपुण प्रशासकीय अधिकारी</p> <p>प्रतिवेदन तयार गर्ने  नेहरू के स्थी.  वास संसंगीजक</p>
